

內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部
飛機棚廠等興建工程中程計畫

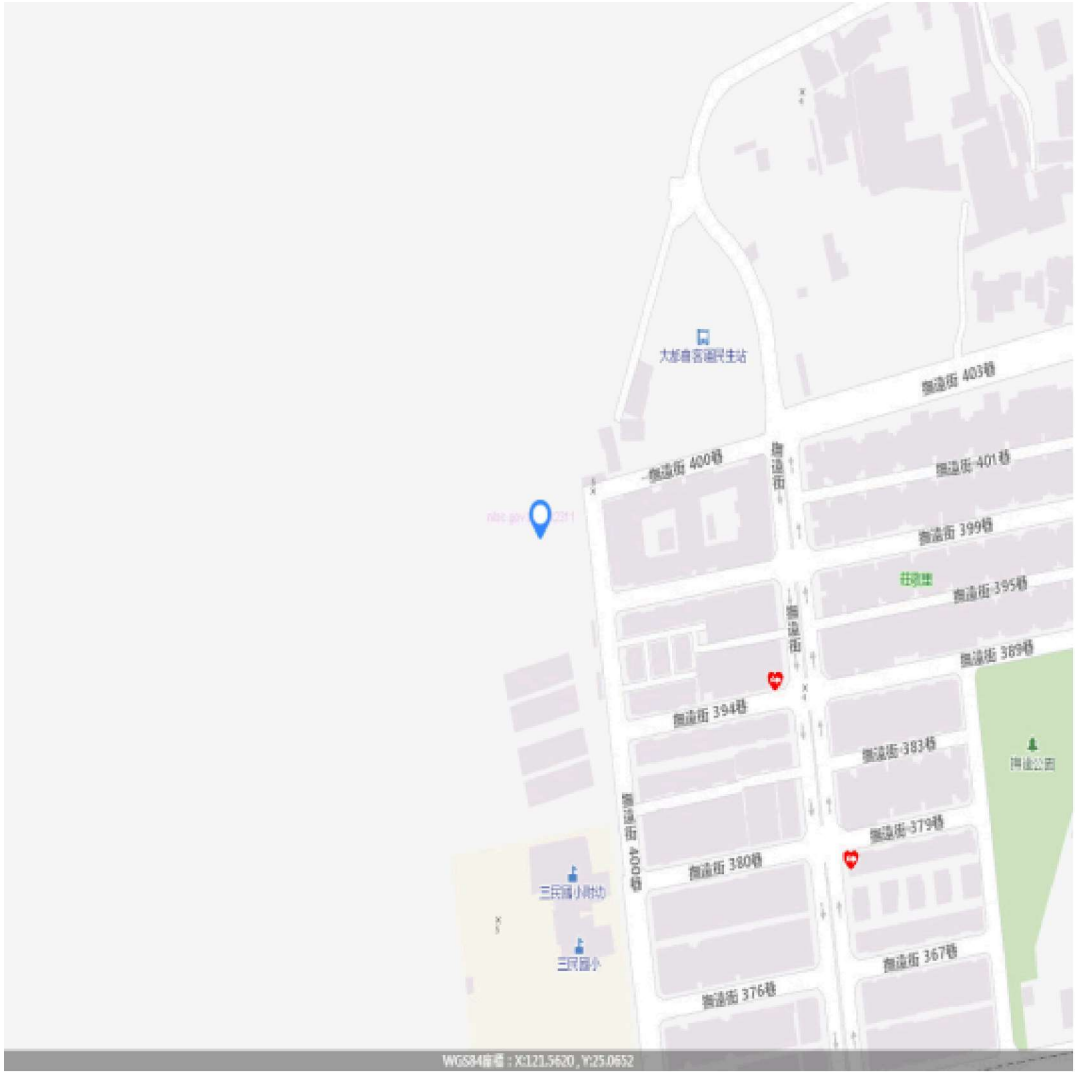
113年度作業計畫

主辦單位(內政部空中勤務總隊/秘書室)113/03/04 14:30

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫	個案計畫統一編號	30-1201-2121
計畫期程	109/08/03至117/12/31	計畫核定經費(千元)	3,499,261
計畫類別(先期類別)	社會發展-社會安全	年計畫經費(千元)	658,778
主管機關	內政部	院核管制編號	1090567
主辦機關(單位)	內政部空中勤務總隊(秘書室)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	內政部空中勤務總隊(秘書室)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		執行地點	台北市
空間資料	線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 預覽		

空間資料	
計畫總目標	一、臺北地區空中支援勤務之各項任務，除為使人民生命財產獲得全方位之保障外，並得支援其他政府機關，包括地區各市縣(市)政府各項施政所需之空中支援勤務如救災、救難、治安掌握、交通規劃、森林滅火、海洋(岸)空偵巡護、環境污染調查、國土監控等之需求。因此，於臺北松山機場內設置1處擁有完善的補給功能且具良好設施的駐地，對全國急難災害救援任務有著迫切需求。 二、空勤總隊勤務第一大隊下轄第一隊將配置AS-365海豚直升機3架、第二隊則配置UH-60M黑鷹直升機3架，執行臺北市、新北市、桃園市、新竹縣(市)、基隆市、宜蘭縣、金門縣，及北部海域等空中救災外，並吸納原8,000呎以上災害救援能量不足時，由國防部空軍救護隊協助執行之任務。 三、本計畫建物將規劃建置符合不同性別需求之性別友善工作環境。
計畫年度目標	興建工程進度達18%
計畫核定情形	1. 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程程計畫：行政院109年08月03日院臺忠字第1090020030號函 2. 內政部空中勤務總隊 臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代 建空軍司令部松山基地指揮部飛機 棚廠等興建工程程計畫：行政院112年07月19日院臺忠字第1121029162號函
隸屬專案(子專案)	

註：本計畫與去年度 1090567 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程程計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
蔡郁暄	專員	02-89111100#701		joanna67@nasc.gov.tw
楊鎮華	秘書	02-89111100#703		jemmy1220@nasc.gov.tw
陳榮信	主任	02-89111100#700		hsin0401@nasc.gov.tw

二、各年進度及預算配置

年度	工作摘要	截至該年度數據			
		總累計進度(%)		總累計分配 經費(千元)	總累計實現 數(千元)
		預定	實際		
109	委辦專業機關代辦工程採購，請代辦機關結合建築、水電、空調、結構、污水、景觀等專業小組實施現地會勘，已完成設計監造建築師評選，需求規劃等。	0.01	0.01	300	21
110	建築師基本設計方案、地質鑽探作業、細部設計，及主要建、器材設備討論與選用。招標文件撰擬等前置作業、公告招標、執行建築相關許可申辦作業、特種建築物都市計畫審議作業及辦理工程發包前置作業，依採購法規定評選優勝廠商。	4.97	7.24	173,734	172,567
111	招標文件撰擬等前置作業、公告招標、執行建築相關許可申辦作業、特種建築物都市計畫審議作業及辦理工程發包前置作業，依採購法規定評選優勝廠商，及執行工程開工。	11.59	16.27	405,357	287,202
112	招標文件撰擬等前置作業、公告招標、執行建築相關許可申辦作業、特種建築物都市計畫審議作業及辦理工程發包前置作業，依採購法規定評選優勝廠商，及執行工程開工，及執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。	38.38	38.38	1,342,682	777,357
113	執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。	41.24		1,436,140	0
114	執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。	58.38		2,036,140	0
115	執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。	75.52		2,636,140	0
116	執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等，及執行5號棚廠修繕施工品質期程稽核及控管，室內需求規劃與履約	92.66		3,236,140	0

	地方	0															
117	中央	148,961															
	地方	0															
備註	一、109年度所需先期作業設計規劃經費新臺幣30萬元，由本總隊臺東駐地中程計畫經費勻支。 二、110年度中程計畫原核定200,000千元，嗣經立法院預算修正為173,434千元。 三、111年度中程計畫原核定250,000千元，嗣經立法院預算修正為231,623千元。 四、112年度中程計畫原核定1,000,000千元，嗣經立法院預算修正為937,325千元。 五、113年度中程計畫原核定100,000千元，嗣經立法院預算修正為93,458千元。 六、因110至113年度共刪減經費114,160千元，本總隊將於最後1年度爭取回編，故117年度總累計分配經費為3,499,261千元。																

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目 名稱	經常門	資本門	小計	說明
勤務棚廠廳舍興建整修工程	0	658,778	658,778	本工程係為解決黑鷹直升機進駐臺北松山駐地現有棚廠及備勤空間不足等問題，以提升北部地區空中救災能量。奉行政院112年7月19日院臺忠字第1121029162號函核定修正，所需總經費3,499,261千元，執行期間自109至117年度。本年度續編第5年經費93,458千元，112年度保留565,320千元，合計113年度可執行經費658,778千元。
小計	0	658,778	658,778	
備註				

參、工作項目

一、工程興建

(一) 基本資料

工作項目名稱	工程興建	權重(%)	100.00
主辦機關	內政部空中勤務總隊(秘書室)	進度計算基準	混合法(工作天：25%、預算值：75%)
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	113/01/01 ~ 113/12/31
預期效益	工程興建及執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
陳榮信	主任	02-89111100#700		hsin0401@nasc.gov.tw
蔡郁暄	專員	02-89111100#701		joanna67@nasc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	建築工程階段	● 假設工程施作達95% (預定 113/03/31 完成)	19.88	120,000
6	建築工程階段	● 地質改良工程進度達30% (預定 113/06/30 完成)	40.89	250,000
9	建築工程階段	● 全面完成地質改良 (預定 113/09/30 完成)	61.98	380,000
12	建築工程階段	● 建築物地下結構工程施作完成 (預定 113/12/31 完成)	100.00	658,778

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	當年度目標	總目標
1.1	建築工程	辦公廳舍(修復)	處	16.27	36.14	52.41

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	38.95	19.88	897,362	120,000
6	39.55	40.89	1,027,362	250,000
9	40.15	61.98	1,157,362	380,000
12	41.24	100.00	1,436,140	658,778

伍、管考基準

一、共同項目(75 %)

項目名稱	權數(%)
計畫管理	25
作業計畫研擬	4
表報提報作業	3
計畫管制作為	3
年度目標之挑戰性與明確性	15
進度控制情形與結果	20
進度控制情形	10

進度控制結果	10
預算控制情形與結果	30
預算控制情形	10
預算控制結果	20

二、自定項目(25%)

年度目標達成情形

自訂項目權數(%)：25

項目 1：工程進度達18%

權數(%)：25

上限分數	下限分數	評分標準 - 衡量方式
100	90	工程進度18.0%以上
89	80	工程進度17%~18%
79	70	工程進度16%~17%
69	60	工程進度14.4%~16%
59	0	工程進度未達14.4%

陸、附件

一、其他相關附件

附件名稱
