


分區辦理搶通、復原、強化工程現況說明

震災重建復原經費30億228萬元

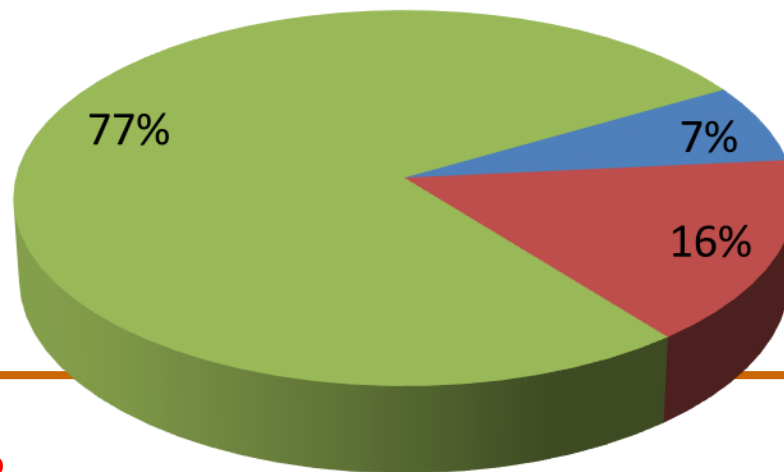

【113年】 7%

2億425萬元

辦理緊急搶修10案、先期調查規劃1案、災修工程7案(不含開口契約)：陸續完工

以移緩濟急方式支應，並申請動支預備金

【116-120年】 77%

23億2,111萬元

提升遊憩安全及品質相關措施

【114-115年】 16%

4億7,692萬元

辦理災後復原與詳評調查、防災強化設計

115年至120年「太魯閣國家公園0403地震災後復建計畫」

行政院113年12月12日院臺環字第1131031532號函准予核定



分期、分區復原計畫



- 第1期** 影響輕微區域：合歡山區、奇萊山區、南湖山區等、經勘查後，已於113年4月12日起陸續開放。
- 第2期** 影響中等區域：太魯閣、天祥、崇德、大清水等遊憩區，及大同大禮，復原工程陸續完成，並持續強化設施安全性。
- 第3期** 影響嚴重區域：砂卡礑步道、燕子口步道、九曲洞步道、白楊步道、布洛灣、匯德、長春祠等，因強震或颱風二次災害嚴重影響，刻正辦理風險調查評估，依成果規劃重建方案(長春祠優先推動強化工程)，並提升遊憩安全，預計120年後完成開放。

截至114年12月

搶通

恢復通行運作

復原

復原設施功能

強化

強化安全提升品質



蘇花地區

搶通 復原 已於114年暑假開放

公廁及停車場回填區尚變動中，穩定後方能重建設施



已於114年暑假開放



太魯閣地區

搶通 復原 強化

遊客中心及台地步道已於113年開放





砂卡礑五間屋賣店全毀



砂卡礫大水管崩塌路段

長春祠地區



長春祠第1階段 復原工程完工

砂卡礑步道

搶通

0403造成嚴重災情，又康芮颱風洪峰侵襲五間屋賣店滅失，多段步道路基毀損，沿線地形仍持續變動，且生態敏感，需持續觀察，滾動檢討對策，預訂120年以後完成復建



大同大禮地區

搶通

復原

得卡倫步道與大禮大同林道災修工程完工，同禮
部落於暑假開放，立霧山於12月4日開放



11月21日~23日同禮部落第2場次淨山活動



由立霧山遠眺太平洋



燕子口

搶通

復原

強化

0403造成嚴重災情，因二次災害地形仍持續變動，10月17日因崩塌形成堰塞湖，10月29日潰壩河道復原，持續進行詳細地質風險調查評估，預訂120年以後完成復建

10月29日潰壩後步道現況

10月17日堰塞湖二次災害

搶通

復原

吊橋安全無虞，復建工程施工中，預訂115年完成

吊橋步道災修工程施工

九曲洞

搶通

復原

復原工程施作中，預訂115年完成

九曲洞災修工程施工



山月村

搶通

復原

強化

國土管理署北區都市基礎工程分署代辦重建工程，設計案作業中，預訂117年完成



設計方案模擬圖

布洛灣聯外道

搶通

復原

強化

連外道路康芮颱風受損嚴重，已搶通，需待邊坡穩定，復建併強化



聯外道路搶通現況



西寶以西地區

0403強震尚無嚴重災情113年已開放

白楊步道

搶通

復原

強化

113年10月底康芮颱風劇烈降雨，步道多處路基掏空、塔次基里溪版橋遭沖斷毀壞，水源中斷(已先行搶通)，白楊瀑布吊橋與觀景平台全遭沖毀，後續風災地形仍持續變動，進行詳細地質風險調查評估中，穩定後方能重建設施

白楊瀑布吊橋與觀景平台全毀



塔次基里溪版橋斷毀



天祥台地

搶通

復原

天祥遊憩區天祥遊客中心、塔比多步道、祥德寺步道已於114年暑假開放



天祥台地



祥德寺



塔比多步道

截至114年12月
