

# 土地重劃之規劃設計監工業務

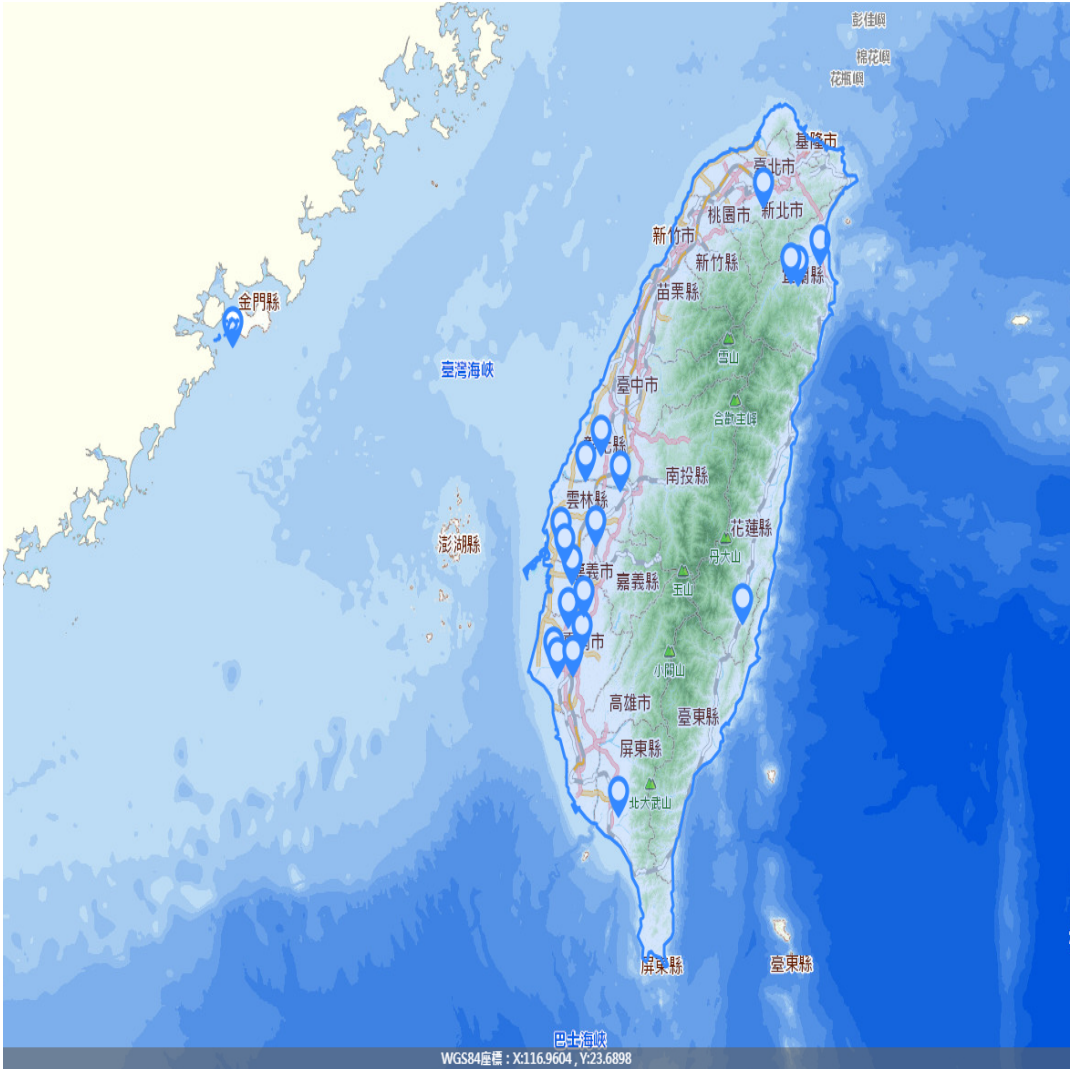
## 113年度作業計畫

主辦單位(內政部土地重劃工程處/農村社區重劃科)113/01/09 11:19

### 壹、計畫概要

#### 一、計畫基本資料

計畫名稱	土地重劃之規劃設計監工業務	個案計畫統一 編號	A0-4240-0133
計畫期程	113/01/01至113/12/31	計畫核定經費 (千元)	7,853
計畫類別(先 期類別)	公共建設- 其他(非屬政府公共建設計畫先 期作業實施要點所列次類別涵攝 範圍者)	年計畫經費( 千元)	7,853
主管機關	內政部	院核管制編號	1130034
主辦機關(單 位)	內政部土地重劃工程處(農村社 區重劃科)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	內政部土地重劃工程處(農村社 區重劃科)	管考週期	月報
共同主辦機關 (地方)		執行地點	
空間資料	面資料：2筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 點資料：20筆 <a href="#">預覽</a>		

<p>空間資料</p>	
<p>計畫總目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、加強土地合理利用，促進都市健全發展。</li> <li>二、精進農業生產效率，改善農村生活環境。</li> <li>三、提升公共工程施工品質。</li> </ul>
<p>計畫年度目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業16區。</li> <li>二、辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導14次。</li> <li>三、完成高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程暨新北市樹林區佳園市地重劃工程委託設計及監造技術服務勞務採購案決標。</li> <li>四、完成農地重劃區農水路工程設計作業2區。</li> <li>五、完成土城司法園區區段徵收公共工程開工。</li> <li>六、完成高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程地形測量及生態檢核作業。</li> </ul>
<p>年度工作摘要</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、辦理土地重劃及區段徵收相關工程之規劃、設計、施工監造及專案管理。</li> </ul>

	二、辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。
未填計畫核定情形說明	非報行政院核定中、長程個案計畫。
隸屬專案(子專案)	

註：本計畫與去年度 1120028 土地重劃之規劃設計監工業務 為關聯計畫

### 計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
陳錦梅	科員	(04)22524985分機2503	(04)22518447	cm.chen@mail.lceb.gov.tw
石金明	科長	(04)22524985分機2501	(04)22518447	lceb0006@mail.lceb.gov.tw

## 貳、預算配置

### 一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A) +(B)+(C)
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理	
113	中央	7,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,853
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	7,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,853
備註												

### 二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明

規劃設計監工業務	6,443	1,410	7,853	辦理土地重劃工程規劃設計監工督導考核。
小計	6,443	1,410	7,853	
備註				

## 參、工作項目

### 一、土地重劃之規劃設計監工業務

#### (一) 基本資料

工作項目名稱	土地重劃之規劃設計監工業務	權重(%)	100.00
主辦機關	內政部土地重劃工程處(農村社區重劃科)	進度計算基準	預算值
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	113/01/01 ~ 113/12/31
預期效益	<p>一、透過重劃或區段徵收手段，無償取得公共設施用地，規劃完善休閒空間，提升居民生活品質。</p> <p>二、建置完整之道路、排水、雨汙水系統，提升都市防災能力，促進都市建設整體發展。</p> <p>三、將不合經濟利用之農地，予以交換分合，適當配置農水路系統，使規劃後之農地能直接灌排，改善農場結構及農業生產環境。</p> <p>四、改善老舊農水路系統，提升水資源運用、農產運輸，增加整體農業生產效率。</p> <p>五、提升各直轄市、(縣)市政府辦理市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程品質。</p>		

#### 工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
陳錦梅	科員	(04)22524985分機2503	(04)22518447	cm.chen@mail.lce b.gov.tw

石金明	科長	(04)22524985分機 2501	(04)22518447	lceb0006@mail.lceb.gov.tw
-----	----	------------------------	--------------	---------------------------

## (二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程資料蒐集。 2.辦理土城司法園區區段徵收開發計畫環境影響說明書變更暨環境監測作業委託技術服務招標作業。	● 完成土城司法園區區段徵收開發計畫環境影響說明書變更暨環境監測作業委託技術服務案決標。(預定 113/01/31 完成)	0.76	60
2	1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程測量作業。 2.辦理高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程暨新北市樹林區佳園市地重劃工程委託設計及監造技術服務招標作業。		10.51	825
3	1.提送宜蘭縣大隱一農地重劃區農水路工程基本設計資料予農業部審議。 2.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。 3.辦理土城司法園區區段徵收公共工程開工作業。	● 1.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導,累計2次。 2.完成土城司法園區區段徵收公共工程開工。(預定 113/03/31 完成)	14.05	1,103
4	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程縱橫斷面設計。		34.11	2,679
5	1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程縱橫斷面設計。	● 完成土城司法園區區段徵收公	37.90	2,976

	<p>2.提送彰化縣柳子溝農地重劃區農水路工程基本設計資料予農業部審議。</p> <p>3.辦理土城司法園區區段徵收公共工程先期圍籬工程(開口契約)驗收作業。</p>	<p>共工程先期圍籬工程(開口契約)驗收作業。(預定 113/05/31 完成)</p>		
6	<p>1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程構造物設計。</p> <p>2.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。</p>	<p>● 辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導,累計4次。(預定 113/06/30 完成)</p>	47.49	3,729
7	<p>辦理屏東縣五溝、金門縣楊厝農地重劃區農水路工程先期規劃作業。</p>		68.69	5,394
8	<p>辦理彰化縣三民農地重劃區農水路工程設計作業。</p>		73.77	5,793
9	<p>1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程預算書編製。</p> <p>2.辦理高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程地形測量作業。</p>	<p>● 1.完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計,累計8區。 2.完成高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程地形測量。(預定 113/09/30 完成)</p>	83.03	6,520
10	<p>1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程預算書編製。</p> <p>2.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。</p> <p>3.辦理高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程生態檢核作業。</p>	<p>● 1.完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計,累計16區。 2.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導,累計10次。(預定 113/10/31 完成)</p>	99.45	7,810

11	辦理土城司法園區區段徵收公共工程公園標細部設計作業。		99.83	7,840
12	1.辦理宜蘭縣大進農地重劃區農水路工程設計作業。 2.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	● 辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導，累計14次。 (預定 113/12/31 完成)	100.00	7,853

### (三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	土木工程	完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業。	區	16.00
1.2	土木工程	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	次	14.00
1.3	土木工程	完成高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程暨新北市樹林區佳園市地重劃工程委託設計及監造技術服務勞務採購案決標。	案	1.00
1.4	土木工程	完成農地重劃區農水路工程設計作業。	區	2.00
1.5	土木工程	完成土城司法園區區段徵收公共工程開工。	區	1.00
1.6	土木工程	完成高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程地形測量及生態檢核作業。	區	1.00

## 肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	0.76	0.76	60	60
2	10.51	10.51	825	825
3	14.05	14.05	1,103	1,103
4	34.11	34.11	2,679	2,679
5	37.90	37.90	2,976	2,976
6	47.49	47.49	3,729	3,729
7	68.69	68.69	5,394	5,394
8	73.77	73.77	5,793	5,793
9	83.03	83.03	6,520	6,520
10	99.45	99.45	7,810	7,810
11	99.83	99.83	7,840	7,840
12	100.00	100.00	7,853	7,853

## 伍、管考基準

### 一、共同項目( 75 %)

項目名稱	權數(%)
計畫管理	25
作業計畫研擬	4
表報提報作業	3
計畫管制作為	3
年度目標之挑戰性與明確性	15
進度控制情形與結果	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
預算控制情形與結果	30
預算控制情形	10



預算控制結果	20
--------	----

## 二、自定項目(25%)

年度目標達成情形

自訂項目權數(%)：25

項目 1：完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業計16區。

權數(%)：15

上限分數	下限分數	評分標準 - 衡量方式
100	90	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至113年底總累計完成16區。
89	80	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至113年底總累計完成15區。
79	70	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至113年底總累計完成14區。
69	60	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至113年底總累計完成13區。
59	0	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至113年底總累計完成未達13區。

項目

2：辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程 督導累計14次。 權數(%)：10

上限分數	下限分數	評分標準 - 衡量方式
100	90	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至113年底總累計完成14次。
89	80	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至113年底總累計完成13次。
79	70	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至113年底總累計完成12次。
69	60	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至113年底總累計完成11次。
59	0	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵

		收工程督導截至113年底總累計完成未達11次。
--	--	-------------------------

## 陸、附件

### 一、其他相關附件

附件名稱
------
